


Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January	November	September	July	May	March
									E	B	E	M	B	E
0			POA Año 1 del Programa PR-L1153	1954 days	Mon 5/3/18	Thu 23/8/25	\$2.282.667,00							
1			Actividades previas de preparación del Programa	240 days	Mon 5/3/18	Fri 1/2/19	\$0,00							
14			Contrato de Préstamo firmado y ratificado por Ley	106 days	Mon 4/2/19	Mon 1/7/19	\$0,00							
15			Elaboración y envío al Congreso del Mensaje del Poder Ejecutivo	6 days	Mon 4/2/19	Mon 11/2/19	\$0,00	MH						
16			Primer Trámite Constitucional - Cámara de Senadores	46 days	Tue 12/2/19	Tue 16/4/19	\$0,00	Cám. Senadores						
17			<i>Ley aprobada por la Cámara de Senadores</i>	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0,00							
18			Segundo Trámite Constitucional - Cámara de Diputados	46 days	Wed 17/4/19	Wed 19/6/19	\$0,00	Cámara de Diputados						
19			<i>Ley sancionada por la Cámara de Diputados</i>	0 days	Wed 19/6/19	Wed 19/6/19	\$0,00							
20			Tramitación de la promulgación de la Ley que aprueba el CP	5 days	Thu 20/6/19	Wed 26/6/19	\$0,00	Congreso Nacional						
21			<i>Ley promulgada</i>	0 days	Wed 26/6/19	Wed 26/6/19	\$0,00							
22			Gestiones para la publicación en la Gaceta Oficial	3 days	Thu 27/6/19	Mon 1/7/19	\$0,00	Gaceta Oficial						
23			<i>Ley de aprobación del CP publicada en la Gaceta Oficial - Elegibilidad del Préstamo</i>	0 days	Mon 1/7/19	Mon 1/7/19	\$0,00							
24			Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00							
25			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Estipulaciones Especiales (según cada Contrato de Préstamo)	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Responsable institucional						
26			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Normas Generales	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Responsable institucional						
27			<i>Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas</i>	0 days	Mon 30/9/19	Mon 30/9/19	\$0,00							
28	1		Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público	1728 days	Tue 16/10/18	Thu 29/5/25	\$354.500,00							
29	1.1	P1	Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas	1198 days	Wed 27/11/19	Fri 28/6/24	\$0,00							
30	1.1.1		SBCC_33. Contratación de Firma Consultora para la revisión del marco legal de la SENATICS y elaboración de propuestas de cambio normativo con asistencia técnica especializada	1198 days	Wed 27/11/19	Fri 28/6/24	\$0,00							
31	1.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 27/11/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
42	1.1.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$0,00							
80	1.2	P2	Producto 2: Servicios simplificados y digitalizados	1500 days	Tue 2/7/19	Mon 31/3/25	\$60.000,00							
81	1.2.1		Tramitación del Decreto que instruya a los sectores el inicio del proceso de simplificación de trámites	200 days	Tue 2/7/19	Mon 6/4/20	\$0,00							
82	1.2.1.1	GRP - Act. # 2.1	Emitir una instrucción de obligatoriedad del poder ejecutivo para dictar la reglamentación pertinente que permita ejecutar la simplificación y digitalización de los trámites para el sector público. El Ministro debe coordinar la instrucción con Presidencia	200 days	Tue 2/7/19	Mon 6/4/20	\$0,00	Director del Programa						
83	1.2.2		SCC_34. Contratación de firma consultora para el diseño metodológico de la simplificación y digitalización	195 days	Tue 3/9/19	Mon 1/6/20	\$60.000,00							
84	1.2.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 3/9/19	Thu 10/10/19	\$0,00							
95	1.2.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 11/10/19	Wed 29/1/20	\$0,00							
115	1.2.2.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Wed 29/1/20	Mon 1/6/20	\$60.000,00							
119	1.2.3		SBCC_35. Contratación de Firma Consultora para simplificar y digitalizar procesos del Grupo 1	820 days	Wed 27/11/19	Tue 17/1/23	\$0,00							

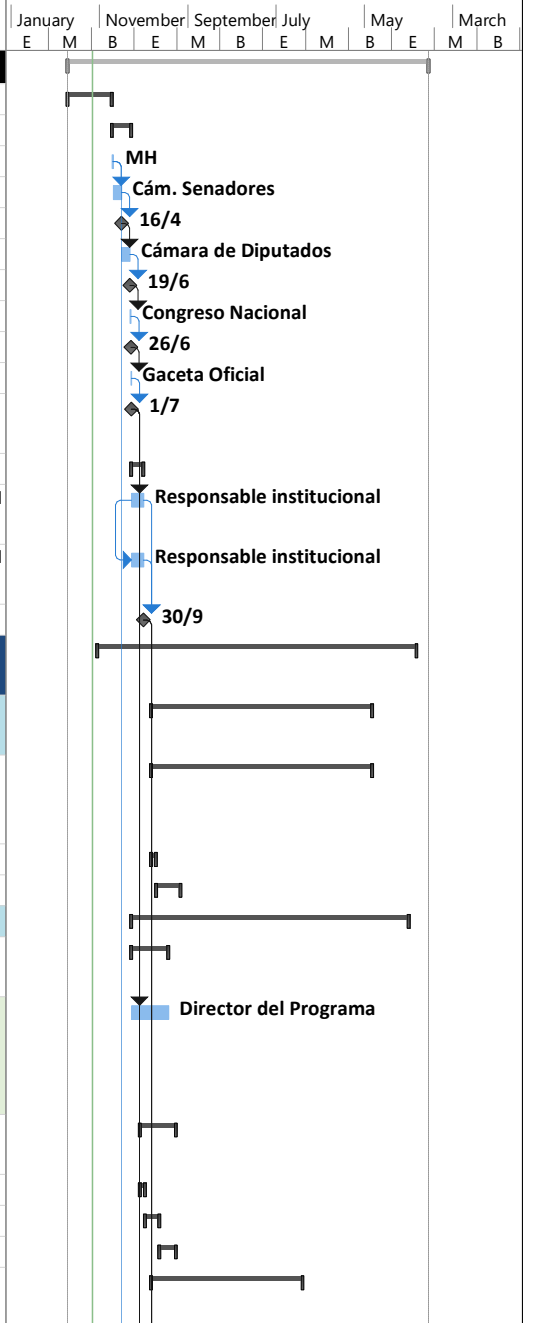

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
120	1.2.3.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 27/11/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
131	1.2.3.2		Etapa de Contratación	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$0,00													
261	1.2.6		SBCC_38. Contratación de Firma Consultora para la supervisión del servicio de simplificación y digitalización de procesos	1404 days	Wed 13/11/19	Mon 31/3/25	\$0,00													
262	1.2.6.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 13/11/19	Fri 20/12/19	\$0,00													
273	1.2.6.2		Etapa de Contratación	132 days	Mon 23/12/19	Tue 23/6/20	\$0,00													
303	1.2.6.3		Etapa de ejecución del contrato	1244 days	Tue 23/6/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
309	1.3	P3	Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), digitalizado	1685 days	Tue 16/10/18	Mon 31/3/25	\$100.000,00													
310	1.3.1		Hito 1: Elaboración del Plan estratégico de TIC para el sector Salud	445 days	Tue 16/10/18	Mon 29/6/20	\$100.000,00													
311	1.3.1.1		Formulación y tramitación del instrumento normativo para simplificar trámites	88 days	Tue 16/10/18	Thu 14/2/19	\$0,00	CT PR-T1255												
312	1.3.1.2		Selección y detalle de las áreas de intervención	88 days	Fri 15/2/19	Tue 18/6/19	\$0,00	CT PR-T1255												
313	1.3.1.3		Mapeo de los procesos a ser simplificados asociados a los servicios de salud	88 days	Wed 19/6/19	Fri 18/10/19	\$0,00	CT PR-T1255												
314	1.3.1.4	GRP - Act. # 2.6	PRT-T1255 diagnosticará y definirá las ampliaciones necesarias a los sistemas de salud. Se realizará una audiencia pública con el lanzamiento. Someter TdR y/o especificaciones técnicas a una consulta previa donde las empresas afinen las propuestas.	88 days	Wed 19/6/19	Fri 18/10/19	\$0,00	CT PR-T1255												
315	1.3.1.5		SCC_39. Contratación de Consultoría para la elaboración de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información del sector Salud	195 days	Tue 1/10/19	Mon 29/6/20	\$100.000,00													
316	1.3.1.5.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00													
327	1.3.1.5.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00													
347	1.3.1.5.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Wed 26/2/20	Mon 29/6/20	\$100.000,00													
351	1.3.2		Hito 2: Desarrollos adicionales del HIS e implementación	1395 days	Tue 26/11/19	Mon 31/3/25	\$0,00													
352	1.3.2.1		SBCC_40. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de software complementario del Sistema de Información de Salud (HIS), incluye la implementación y gestión del cambio	1395 days	Tue 26/11/19	Mon 31/3/25	\$0,00													
353	1.3.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 26/11/19	Thu 2/1/20	\$0,00													
364	1.3.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 3/1/20	Mon 6/7/20	\$0,00													
402	1.3.3		Hito 3: Provisión de software y hardware para el HIS	1360 days	Tue 14/1/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
403	1.3.3.1		LPI_5. Adquisición de equipos informáticos y accesorios	1360 days	Tue 14/1/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
404	1.3.3.1.1		Etapa previa	28 days	Tue 14/1/20	Thu 20/2/20	\$0,00													
411	1.3.3.1.2		Etapa de Contratación	99 days	Fri 21/2/20	Wed 8/7/20	\$0,00													
444	1.4	P4	Producto 4: Plan de Mejora de los servicios brindados por el Servicio Nacional de Catastro, implementado	1129 days	Tue 4/2/20	Fri 31/5/24	\$0,00													
445	1.4.1		Hito 1: Modelo de atención multicanal implementado	367 days	Tue 4/2/20	Wed 30/6/21	\$0,00													
446	1.4.1.1		SCC_41. Contratación de Firma Consultora para el diseño, desarrollo e implementación de un modelo de atención multicanal (presencial, digital y telefónico), para el SNC	367 days	Tue 4/2/20	Wed 30/6/21	\$0,00													
447	1.4.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 4/2/20	Thu 12/3/20	\$0,00													
458	1.4.1.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 13/3/20	Wed 1/7/20	\$0,00													
482	1.4.2		Hito 2: Plataforma de hardware y software de base modernizada	556 days	Mon 6/4/20	Mon 23/5/22	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
483	1.4.2.1		SBCC_42. Contratación de servicios para migración de datos y actualización de la plataforma del Sistema de Explotación Catastral (SIECA)	556 days	Mon 6/4/20	Mon 23/5/22	\$0,00													
484	1.4.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Mon 6/4/20	Wed 13/5/20	\$0,00													
495	1.4.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Thu 14/5/20	Fri 13/11/20	\$0,00													
529	1.4.2.2		LPN_6. Adquisición de servidores y storage para el SNC	369 days	Mon 6/4/20	Thu 2/9/21	\$0,00													
530	1.4.2.2.1		Etapa previa	28 days	Mon 6/4/20	Wed 13/5/20	\$0,00													
537	1.4.2.2.2		Proceso de Contratación	77 days	Thu 14/5/20	Fri 28/8/20	\$0,00													
717	1.5	P5	Producto 5: Aplicaciones transversales de gobierno digital, desarrolladas e implementadas	1438 days	Thu 26/9/19	Mon 31/3/25	\$0,00													
765	1.5.2		Proyecto 2: Plataforma para la Gestión de Expediente Electrónico	676 days	Thu 26/9/19	Thu 28/4/22	\$0,00													
766	1.5.2.1		SBCC_47. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de la Plataforma para la Gestión de Expediente Electrónico y Notificación Electrónica, incluye un diagnóstico, el desarrollo y la implementación con gestión del cambio	676 days	Thu 26/9/19	Thu 28/4/22	\$0,00													
767	1.5.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 26/9/19	Mon 4/11/19	\$0,00													
778	1.5.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Tue 5/11/19	Wed 6/5/20	\$0,00													
808	1.5.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	516 days	Wed 6/5/20	Thu 28/4/22	\$0,00													
1051	1.6	P6	Producto 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado	1543 days	Tue 2/7/19	Thu 29/5/25	\$30.000,00													
1052	1.6.1		Hito 1: Modelo del Fondo Concursable diseñado	1301 days	Tue 2/7/19	Tue 25/6/24	\$30.000,00													
1053	1.6.1.1	GRP - Act. # 2.4	Definir una metodología para la operación del GobLab e instrumentos de gestión (criterios de selección e identificación de las propuestas y procedimientos)	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Director del Programa												
1054	1.6.1.2		3CV_88. Contratación de consultor para la elaboración del diseño del Reglamento Operativo del Fondo Concursable de Proyectos	157 days	Mon 28/10/19	Tue 2/6/20	\$30.000,00													
1055	1.6.1.2.1		Etapa previa	18 days	Mon 28/10/19	Wed 20/11/19	\$0,00													
1061	1.6.1.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Thu 21/11/19	Thu 30/1/20	\$0,00													
1077	1.6.1.2.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Thu 30/1/20	Tue 2/6/20	\$30.000,00													
1081	1.6.1.3		Elaboración de los proyectos	1060 days	Wed 3/6/20	Tue 25/6/24	\$0,00													
1083	1.6.2		Proyecto 1: Sistema Único de Beneficiarios de Programas Sociales implementado	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1084	1.6.2.1		SBCC_60. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de un diagnóstico, la integración de la base de datos y gestión de cambio para la implementación del Sistema Único de Beneficiarios de Programas Sociales	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1085	1.6.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00													
1096	1.6.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00													
1126	1.6.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$0,00													
1130	1.6.3		Proyecto 2: Sistema Único de Productores implementado	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
1131	1.6.3.1		SBCC_61. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de un diagnóstico, la integración de base de datos y gestión de cambio para la implementación del Sistema Único de Productores	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1132	1.6.3.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00													
1143	1.6.3.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00													
1173	1.6.3.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$0,00													
1177	1.6.4		Proyecto 3: IOT	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1178	1.6.4.1		SBCC_134. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Proyecto IOT	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1179	1.6.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00													
1190	1.6.4.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00													
1220	1.6.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$0,00													
1224	1.6.5		Proyecto 4: Big Data	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1225	1.6.5.1		SBCC_135. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Proyecto Big Data	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1226	1.6.5.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00													
1237	1.6.5.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00													
1267	1.6.5.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$0,00													
1271	1.6.6		Proyecto 5: Otros proyectos financiados	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1272	1.6.6.1		SBCC_62. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de Proyectos	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$0,00													
1273	1.6.6.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00													
1284	1.6.6.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00													
1314	1.6.6.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$0,00													
1319	1.6.7		3CV_89. Contratación de consultor para apoyo al desarrollo de los Proyectos del Fondo Concursable (Líder de Proyecto)	1349 days	Mon 30/3/20	Thu 29/5/25	\$0,00													
1320	1.6.7.1		Etapa previa	18 days	Mon 30/3/20	Wed 22/4/20	\$0,00													
1326	1.6.7.2		Etapa de Contratación	51 days	Thu 23/4/20	Thu 2/7/20	\$0,00													
1371	1.7	P7	Producto 7: Modelo de atención multicanal, implementado	1509 days	Wed 19/6/19	Mon 31/3/25	\$50.000,00													
1372	1.7.1		Elaboración del diseño de un modelo de atención multicanal (electrónico, el presencial y el telefónico) referencial para la puesta en marcha de la prestación de los servicios públicos	132 days	Wed 19/6/19	Thu 19/12/19	\$0,00	PR-T1255												
1373	1.7.2	GRP - Act. # 2.5	PR-T1255 diseñará el modelo multicanal y hoja de ruta para su implementación Se realizará una audiencia pública con el lanzamiento. Someter TdR y/o especificaciones técnicas a una consulta previa donde las empresas afinen las propuestas.	132 days	Wed 19/6/19	Thu 19/12/19	\$0,00	PR-T1255												
1374	1.7.3		SCC_53. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Plan Nacional de Servicios Ciudadanos	239 days	Fri 4/10/19	Wed 2/9/20	\$50.000,00													
1375	1.7.3.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 4/10/19	Tue 12/11/19	\$0,00													
1386	1.7.3.2		Etapa de Contratación	79 days	Wed 13/11/19	Mon 2/3/20	\$0,00													
1406	1.7.3.3		Etapa de ejecución del contrato	132 days	Mon 2/3/20	Wed 2/9/20	\$50.000,00													
1584	1.7.8		Hito 2: Call center del Estado implementado	651 days	Fri 31/1/20	Fri 29/7/22	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
1585	1.7.8.1		LPI_19. Contratación de servicios de centro de llamadas para la atención ciudadana en la implementación de servicios públicos	651 days	Fri 31/1/20	Fri 29/7/22	\$0,00													
1586	1.7.8.1.1		Etapa previa	28 days	Fri 31/1/20	Tue 10/3/20	\$0,00													
1593	1.7.8.1.2		Etapa de Contratación	99 days	Wed 11/3/20	Mon 27/7/20	\$0,00													
1618	1.7.9		Hito 3: Centros de Servicio Integrados, implementados	1313 days	Wed 19/6/19	Fri 28/6/24	\$0,00													
1619	1.7.9.1		Definición del Modelo de Gestión del Centros de Servicio Integrados con los mecanismos de financiamiento y operación	264 days	Wed 19/6/19	Mon 22/6/20	\$0,00	CT PR-T1255												
1620	1.7.9.2		Instalación de los centros de servicios	1015 days	Mon 11/5/20	Fri 29/3/24	\$0,00													
1767	1.7.10		Hito 4: Sistema CRM implementado	692 days	Tue 7/4/20	Wed 30/11/22	\$0,00													
1768	1.7.10.1		SBCC_57. Contratación de Firma Consultora para la configuración, adaptación e integración de la herramienta CRM, incluye la implementación y gestión del cambio.	692 days	Tue 7/4/20	Wed 30/11/22	\$0,00													
1769	1.7.10.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 7/4/20	Thu 14/5/20	\$0,00													
1780	1.7.10.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/5/20	Mon 16/11/20	\$0,00													
1814	1.7.10.2		SBCC_58. Contratación de Firma Consultora para desarrollo de la Carpeta Ciudadana, incluyendo estudios previos para la definición de la arquitectura y desarrollo de un modelo de carpeta e integración con el CRM	688 days	Tue 7/4/20	Thu 24/11/22	\$0,00													
1815	1.7.10.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 7/4/20	Thu 14/5/20	\$0,00													
1826	1.7.10.2.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/5/20	Mon 16/11/20	\$0,00													
1861	1.8	P8	Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido	1328 days	Tue 1/10/19	Thu 31/10/24	\$114.500,00													
1862	1.8.1		Entregable 1: Marco Legal y Regulatorio ajustado	327 days	Tue 1/10/19	Wed 30/12/20	\$100.000,00													
1863	1.8.1.1		SCC_63. Contratación de Firma para la revisión del marco normativo en seguridad cibernética y de la información, del marco regulatorio actual, armonización de los mismos y una propuesta de cambio normativo	327 days	Tue 1/10/19	Wed 30/12/20	\$42.500,00													
1864	1.8.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00													
1875	1.8.1.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00													
1895	1.8.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	220 days	Wed 26/2/20	Wed 30/12/20	\$42.500,00													
1899	1.8.1.2		SCC_64. Contratación de Firma para Asesoría en temas relacionados con la administración de seguridad de la información para crear un modelo de política aplicable a instituciones públicas con infraestructura crítica y un código de conducta para operadores	327 days	Tue 1/10/19	Wed 30/12/20	\$57.500,00													
1900	1.8.1.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00													
1911	1.8.1.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00													
1931	1.8.1.2.3		Etapa de ejecución del contrato	220 days	Wed 26/2/20	Wed 30/12/20	\$57.500,00													
1935	1.8.2		Entregable 2: Manejo de Incidentes e Investigaciones a través del SOC	650 days	Fri 3/1/20	Thu 30/6/22	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
1936	1.8.2.1		SBCC_65. Contratación de Firma para la implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para el Manejo de Incidentes e Investigaciones	650 days	Fri 3/1/20	Thu 30/6/22	\$0,00													
1937	1.8.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 3/1/20	Tue 11/2/20	\$0,00													
1948	1.8.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Wed 12/2/20	Thu 13/8/20	\$0,00													
1982	1.8.2.2		Provisión de herramientas y mejoramiento de la infraestructura para el CERT-PY en el marco de la implementación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)	22 days	Fri 3/1/20	Mon 3/2/20	\$0,00													
1983	1.8.2.2.1		Actividades y presupuesto a definir	22 days	Fri 3/1/20	Mon 3/2/20	\$0,00													
1984	1.8.3		Entregable 3: Implementación de un equipo de seguridad específico para infraestructuras críticas	367 days	Fri 3/1/20	Mon 31/5/21	\$14.500,00													
1985	1.8.3.1		SBE_9. Adquisición de herramientas para infraestructuras críticas, incluye capacitación	324 days	Fri 3/1/20	Wed 31/3/21	\$10.000,00													
1986	1.8.3.1.1		Etapa previa	14 days	Fri 3/1/20	Wed 22/1/20	\$0,00													
1991	1.8.3.1.2		Proceso de Contratación	48 days	Thu 23/1/20	Mon 30/3/20	\$0,00													
2008	1.8.3.1.3		Ejecución del contrato	262 days	Mon 30/3/20	Wed 31/3/21	\$10.000,00													
2012	1.8.3.2		SCC_66. Contratación de Firma Consultora para la creación de una base de datos nacional de infraestructura crítica	367 days	Fri 3/1/20	Mon 31/5/21	\$4.500,00													
2013	1.8.3.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 3/1/20	Tue 11/2/20	\$0,00													
2024	1.8.3.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Wed 12/2/20	Mon 1/6/20	\$0,00													
2044	1.8.3.2.3		Etapa de ejecución del contrato	260 days	Mon 1/6/20	Mon 31/5/21	\$4.500,00													
2048	1.8.4		Entregable 4: Concienciación y Creación de Capacidad en Ciberseguridad	1238 days	Tue 4/2/20	Thu 31/10/24	\$0,00													
2049	1.8.4.1		SCC_67. Contratación de Firma para la elaboración de estudios de Ciberseguridad	238 days	Tue 4/2/20	Thu 31/12/20	\$0,00													
2050	1.8.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 4/2/20	Thu 12/3/20	\$0,00													
2061	1.8.4.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 13/3/20	Wed 1/7/20	\$0,00													
2171	2		Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas	1563 days	Tue 2/7/19	Thu 26/6/25	\$162.000,00													
2172	2.1	P9	Producto 9: Emprendimientos con Base Digital, financiados con capital semilla	1369 days	Fri 25/10/19	Wed 22/1/25	\$70.000,00													
2173	2.1.1		Hito 1: Emprendimientos con Base Digital de la Etapa I, realizados	1109 days	Fri 25/10/19	Wed 24/1/24	\$31.250,00													
2174	2.1.1.1		3CV_91. Contratación de consultor para la elaboración de los Reglamentos Operativos para el financiamiento de proyectos de Emprendimientos con Base Digital, Etapa I	113 days	Fri 25/10/19	Tue 31/3/20	\$20.000,00													
2175	2.1.1.1.1		Etapa previa	18 days	Fri 25/10/19	Tue 19/11/19	\$0,00													
2181	2.1.1.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 20/11/19	Wed 29/1/20	\$0,00													
2197	2.1.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	44 days	Wed 29/1/20	Tue 31/3/20	\$20.000,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
2201	2.1.1.2		SCC_69. Contratación de Firma para la elaboración del diseño e implementación de la plataforma de Emprendimientos con Base Digital de la Etapa I	284 days	Thu 26/12/19	Tue 26/1/21	\$11.250,00													
2202	2.1.1.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 26/12/19	Mon 3/2/20	\$0,00													
2213	2.1.1.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Tue 4/2/20	Fri 22/5/20	\$0,00													
2237	2.1.1.3		Difusión de las convocatorias	748 days	Fri 1/5/20	Tue 14/3/23	\$0,00													
2242	2.1.1.4	GRP - Act. # 3.2	Supervisión y monitoreo efectivos y asignación de recursos	132 days	Fri 1/5/20	Mon 2/11/20	\$0,00	Director Misional												
2243	2.1.1.5		Evento de lanzamiento	727 days	Tue 2/6/20	Wed 15/3/23	\$0,00													
2248	2.1.1.6		Apertura de la ventanilla y recepción de EBD	736 days	Wed 3/6/20	Wed 29/3/23	\$0,00													
2253	2.1.1.7		Evaluación de las propuestas	741 days	Wed 17/6/20	Wed 19/4/23	\$0,00													
2258	2.1.1.8		3CV_92. Contratación de consultor para el desarrollo de capacitaciones en modalidad presencial a potenciales beneficiarios de los fondos concursables de la Etapa I	984 days	Fri 17/4/20	Wed 24/1/24	\$0,00													
2259	2.1.1.8.1		Etapa previa	18 days	Fri 17/4/20	Tue 12/5/20	\$0,00													
2265	2.1.1.8.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 13/5/20	Wed 22/7/20	\$0,00													
2334	2.1.2		Hito 2: Emprendimientos con Base Digital de la Etapa II, realizados	1300 days	Wed 29/1/20	Wed 22/1/25	\$38.750,00													
2335	2.1.2.1		3CV_91. Contratación de consultor para la elaboración de los Reglamentos Operativos para el financiamiento de proyectos de Emprendimientos con Base Digital, Etapa II	44 days	Wed 29/1/20	Tue 31/3/20	\$20.000,00													
2336	2.1.2.1.1		Etapa de ejecución del contrato	44 days	Wed 29/1/20	Tue 31/3/20	\$20.000,00													
2415	2.2	P10	Producto 10: Actividades para la promoción del emprendedurismo con BD, realizadas	1328 days	Thu 27/2/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
2416	2.2.1		Hito 1: Emprendimientos con Base Digital en fase de expansión, promocionados	1274 days	Fri 17/4/20	Wed 5/3/25	\$0,00													
2417	2.2.1.1		Difusión de las convocatorias	990 days	Fri 1/5/20	Thu 15/2/24	\$0,00													
2423	2.2.1.2		Apertura de la ventanilla y recepción de EBD de la Etapa II	978 days	Tue 2/6/20	Thu 29/2/24	\$0,00													
2429	2.2.1.3		Evaluación de las propuestas	983 days	Tue 16/6/20	Thu 21/3/24	\$0,00													
2435	2.2.1.4		3CV_94. Contratación de consultor para realizar capacitaciones en modalidad presencial a emprendedores de Proyectos con Base Digital en fase de expansión	1225 days	Fri 17/4/20	Thu 26/12/24	\$0,00													
2436	2.2.1.4.1		Etapa previa	18 days	Fri 17/4/20	Tue 12/5/20	\$0,00													
2442	2.2.1.4.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 13/5/20	Wed 22/7/20	\$0,00													
2511	2.2.2		Hito 2: Emprendedores, inversores y gestores, capacitados	1328 days	Thu 27/2/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
2512	2.2.2.1		SBCC_127. Contratación de servicios de capacitación para emprendedores de Proyectos con Base Digital	1292 days	Fri 17/4/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
2513	2.2.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 17/4/20	Tue 26/5/20	\$0,00													
2524	2.2.2.1.2		Etapa de contratación	132 days	Tue 19/5/20	Wed 18/11/20	\$0,00													
2566	2.2.2.2		SCC_128. Contratación de servicios de capacitación para mentores de Proyectos con Base Digital	1287 days	Thu 27/2/20	Fri 31/1/25	\$0,00													
2567	2.2.2.2.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 27/2/20	Mon 6/4/20	\$0,00													
2578	2.2.2.2.5		Etapa de Contratación	79 days	Tue 7/4/20	Fri 24/7/20	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
2610	2.2.2.3		SCC_129. Contratación de servicios de capacitación para inversores	1321 days	Thu 27/2/20	Thu 20/3/25	\$0,00													
2611	2.2.2.3.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 27/2/20	Mon 6/4/20	\$0,00													
2622	2.2.2.3.5		Etapa de Contratación	79 days	Tue 7/4/20	Fri 24/7/20	\$0,00													
2654	2.2.2.4		SCC_130. Contratación de servicios de capacitación para agentes financieros de Proyectos con Base Digital	1321 days	Thu 27/2/20	Thu 20/3/25	\$0,00													
2655	2.2.2.4.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 27/2/20	Mon 6/4/20	\$0,00													
2666	2.2.2.4.5		Etapa de Contratación	79 days	Tue 7/4/20	Fri 24/7/20	\$0,00													
2699	2.3	P11	Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras, captadas	1154 days	Tue 28/1/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
2700	2.3.1		SBC_70. Contratación de Firma para Asesoría temas legales, laborales, financieros e impositivos para Iniciativas Digitales Extranjeras	1154 days	Tue 28/1/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
2701	2.3.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 28/1/20	Thu 5/3/20	\$0,00													
2712	2.3.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 6/3/20	Mon 7/9/20	\$0,00													
2752	2.4	P12	Producto 12: Jóvenes con talento digital identificado	1216 days	Fri 1/11/19	Fri 28/6/24	\$50.000,00													
2753	2.4.1		SCC_71. Contratación de Firma para el diseño de Olimpiadas de Talento Digital	173 days	Fri 1/11/19	Tue 30/6/20	\$50.000,00													
2754	2.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 1/11/19	Tue 10/12/19	\$0,00													
2765	2.4.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Wed 11/12/19	Mon 30/3/20	\$0,00													
2785	2.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Mon 30/3/20	Tue 30/6/20	\$50.000,00													
2883	2.5	P13	Producto 13: Personas formadas en certificaciones de competencias digitales	1195 days	Tue 3/12/19	Mon 1/7/24	\$0,00													
2884	2.5.1		Funcionamiento de una mesa de diálogo	1173 days	Wed 1/1/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
2886	2.5.2		Talleres de articulación	1173 days	Wed 1/1/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
2888	2.5.3		SBC_131. Contratación de servicios de capacitación para realizar cursos de corta duración en modalidad presencial a través de plataformas digitales	1194 days	Tue 3/12/19	Fri 28/6/24	\$0,00													
2889	2.5.3.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 3/12/19	Thu 9/1/20	\$0,00													
2900	2.5.3.5		Etapa de contratación	132 days	Thu 2/1/20	Fri 3/7/20	\$0,00													
2940	2.5.4		SBC_132. Contratación de servicios de capacitación para realizar cursos de larga duración en modalidad presencial a través de plataformas digitales	1195 days	Tue 3/12/19	Mon 1/7/24	\$0,00													
2941	2.5.4.5		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 3/12/19	Thu 9/1/20	\$0,00													
2952	2.5.4.6		Etapa de contratación	132 days	Thu 2/1/20	Fri 3/7/20	\$0,00													
2993	2.6	P14	Producto 14: Proyectos asociativos para la mejora de programas de formación en tecnologías digitales, ejecutados	1239 days	Wed 1/1/20	Mon 30/9/24	\$0,00													
2994	2.6.1		Funcionamiento de una mesa de articulación	1173 days	Wed 1/1/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
2996	2.6.2		Proyectos de mejora	1173 days	Thu 2/4/20	Mon 30/9/24	\$0,00													
2998	2.6.3		SBE_24. Contratación de servicios para organización de talleres y eventos	1103 days	Wed 8/4/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
2999	2.6.3.1		Etapa previa	14 days	Wed 8/4/20	Mon 27/4/20	\$0,00													
3004	2.6.3.2		Proceso de Contratación	48 days	Tue 28/4/20	Thu 2/7/20	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
3109	2.7	P15	Producto 15: Servicios para la industria de TIC implementados	1106 days	Fri 3/4/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
3110	2.7.1		Proyectos de servicios para la industria de TIC	1106 days	Fri 3/4/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
3120	2.8	P16	Producto 16: Proyectos de transformación digital sectorial financiados	1173 days	Wed 3/6/20	Fri 29/11/24	\$0,00													
3121	2.8.1		Mesa de articulación	1173 days	Wed 3/6/20	Fri 29/11/24	\$0,00													
3132	2.9	P17	Producto 17: Distrito digital operando	1563 days	Tue 2/7/19	Thu 26/6/25	\$42.000,00													
3133	2.9.1		Hito 1: Modelo de Gestión Institucional y Financiero del Distrito, elaborado	157 days	Thu 24/10/19	Fri 29/5/20	\$20.000,00													
3134	2.9.1.1		3CV_96. Contratación de Consultor para la elaboración del Estudio del Modelo de Gestión Institucional y Financiero del Distrito Digital	157 days	Thu 24/10/19	Fri 29/5/20	\$20.000,00													
3135	2.9.1.1.1		Etapa previa	18 days	Thu 24/10/19	Mon 18/11/19	\$0,00													
3141	2.9.1.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Tue 19/11/19	Tue 28/1/20	\$0,00													
3157	2.9.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Tue 28/1/20	Fri 29/5/20	\$20.000,00													
3161	2.9.2		Hito 2: Diseño y proyecto ejecutivo, elaborados	374 days	Tue 2/7/19	Fri 4/12/20	\$22.000,00													
3162	2.9.2.1	GRP - Act. 3.3	Evaluar locaciones alternativas para el distrito digital	132 days	Tue 2/7/19	Wed 1/1/20	\$0,00													
3163	2.9.2.2		SBCC_75. Contratación de Firma para la elaboración del Diseño Ejecutivo de Obras para el Distrito Digital	292 days	Thu 24/10/19	Fri 4/12/20	\$22.000,00													
3164	2.9.2.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 24/10/19	Mon 2/12/19	\$0,00													
3175	2.9.2.2.2		Etapa de Contratación	132 days	Tue 3/12/19	Wed 3/6/20	\$0,00													
3205	2.9.2.2.3		Etapa de ejecución del contrato	132 days	Wed 3/6/20	Fri 4/12/20	\$22.000,00													
3346	3		Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$0,00													
3347	3.1	P18	Producto 18: Sitios y edificios públicos conectados	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$0,00													
3348	3.1.1		Hito 1: Sitios públicos conectados	1233 days	Tue 1/10/19	Thu 20/6/24	\$0,00													
3349	3.1.1.1	GRP - Act. # 3.5	Ayuda memoria con plan de ejecución interinstitucional	66 days	Tue 1/10/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa												
3350	3.1.1.2		LPI_25. Contratación de Servicios de conectividad para el público en espacios públicos abiertos (plazas) - Grupo 1	648 days	Tue 7/1/20	Thu 30/6/22	\$0,00													
3351	3.1.1.2.1		Etapa previa	28 days	Tue 7/1/20	Thu 13/2/20	\$0,00													
3358	3.1.1.2.2		Etapa de Contratación	99 days	Fri 14/2/20	Wed 1/7/20	\$0,00													
3418	3.1.1.4		LPI_11. Adquisición de servidores (nodo central) para soporte de la conectividad de Espacios Públicos (plazas)	215 days	Mon 6/1/20	Fri 30/10/20	\$0,00													
3419	3.1.1.4.1		Etapa previa	28 days	Mon 6/1/20	Wed 12/2/20	\$0,00													
3426	3.1.1.4.2		Etapa de Contratación	99 days	Thu 13/2/20	Tue 30/6/20	\$0,00													
3447	3.1.1.4.3		Ejecución del contrato	88 days	Tue 30/6/20	Fri 30/10/20	\$0,00													
3451	3.1.2		Hito 2: Sitios públicos del MSPBS conectados	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$0,00													
3452	3.1.2.1	GRP - Act. # 3.5	Ayuda memoria con plan de ejecución interinstitucional	66 days	Tue 1/10/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa												

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
3453	3.1.2.2		LPI_28. Contratación de Servicios de conectividad para Establecimientos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1164 days	Tue 14/1/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
3454	3.1.2.2.1		Etapa previa	28 days	Tue 14/1/20	Thu 20/2/20	\$0,00													
3461	3.1.2.2.2		Etapa de Contratación	99 days	Fri 21/2/20	Wed 8/7/20	\$0,00													
3489	3.1.2.3		LPI_11. Adquisición de servidores (nodo central) para soporte de la conectividad de Establecimientos del MSPBS	88 days	Tue 30/6/20	Fri 30/10/20	\$0,00													
3490	3.1.2.3.1		Ejecución del contrato	88 days	Tue 30/6/20	Fri 30/10/20	\$0,00													
3534	3.1.4		SBCB_136. Contratación de Estudios para la instalación del primer Satélite del Paraguay y puesta en marcha de un Programa Nacional de Observación Terrestre	678 days	Tue 26/11/19	Thu 30/6/22	\$0,00													
3535	3.1.4.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 26/11/19	Thu 2/1/20	\$0,00													
3546	3.1.4.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 3/1/20	Mon 6/7/20	\$0,00													
3580	3.2	P19	Producto 19: Data Center operando	1433 days	Wed 1/1/20	Fri 27/6/25	\$0,00													
3581	3.2.1		Hito 1: Data Center construido	1048 days	Tue 7/1/20	Thu 11/1/24	\$0,00													
3582	3.2.1.1		SBCB_77. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo del Diseño ejecutivo de obras	248 days	Tue 7/1/20	Thu 17/12/20	\$0,00													
3583	3.2.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 7/1/20	Thu 13/2/20	\$0,00													
3594	3.2.1.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 14/2/20	Mon 17/8/20	\$0,00													
3776	3.2.4	GRP - Act. # 3.6	En el corto plazo contratar a los recursos humanos y en el largo plazo capacitarlos	130 days	Wed 1/1/20	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa												
3777	3.3	P20	Producto 20: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos	913 days	Wed 1/1/20	Fri 30/6/23	\$0,00													
3778	3.3.1	GRP - Act. # 3.7	Elaborar un plan de socialización y consulta pública de los pliegos de bases y condiciones	130 days	Wed 1/1/20	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa												
3779	3.3.2	GRP - Act. # 3.8	Aprobación del plan de gobernanza y modelos de negocios antes de iniciar la licitación de los derechos de uso de la conectividad internacional	132 days	Wed 1/1/20	Thu 2/7/20	\$0,00	Director del Programa												
3815	4		Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital	1670 days	Mon 4/2/19	Fri 27/6/25	\$380.000,00													
3816	4.1	P21	Producto 21: Nuevo Modelo de Gestión institucional diseñado e implementado	1670 days	Mon 4/2/19	Fri 27/6/25	\$30.000,00													
3817	4.1.1		Hito 1: Diagnóstico situacional en profundidad y propuesta de diseño del Nuevo Modelo elaborado	264 days	Mon 4/2/19	Thu 6/2/20	\$0,00													
3820	4.1.2		Hito 2: Nuevo Plan Estratégico Institucional diseñado	264 days	Mon 4/2/19	Thu 6/2/20	\$0,00													
3823	4.1.3		Hito 3: Instrumentos para la redefinición del Nuevo Modelo de Gestión institucional diseñados	750 days	Fri 7/2/20	Thu 22/12/22	\$0,00													
3834	4.1.5		Hito 5: Estrategia de Gestión del Cambio diseñada e implementada	1406 days	Fri 7/2/20	Fri 27/6/25	\$0,00													
3838	4.1.6		Entregable 6: Diseño final del Nuevo Modelo de Gestión y actividades de implementación (SEGUNDA ETAPA)	980 days	Mon 11/5/20	Fri 9/2/24	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
3896	4.3	P23	Producto 23: Sistema Informático Integrado de Gestión implementado	1342 days	Fri 7/2/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
3897	4.3.1		Hito 1: Sistema Informático Integrado de Gestión diseñado	559 days	Fri 7/2/20	Wed 30/3/22	\$0,00													
3898	4.3.1.1		SBCB_80. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del diseño, el desarrollo y la implementación del Sistema Informático Integrado de Gestión de SENATICS	559 days	Fri 7/2/20	Wed 30/3/22	\$0,00													
3899	4.3.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 7/2/20	Tue 17/3/20	\$0,00													
3910	4.3.1.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Wed 18/3/20	Thu 17/9/20	\$0,00													
3951	4.4	P24	Producto 24: Capacidad técnica y operativa de la SENATICS incrementada	1435 days	Tue 1/10/19	Mon 31/3/25	\$300.000,00													
3952	4.4.1		3CV_97. Contratación de profesionales varios - Grupo 1	849 days	Tue 1/10/19	Fri 30/12/22	\$300.000,00													
3953	4.4.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
3959	4.4.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
3975	4.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	780 days	Fri 3/1/20	Fri 30/12/22	\$300.000,00													
3979	4.4.2		3CV_98. Contratación de profesionales varios - Grupo 2	849 days	Tue 31/3/20	Fri 30/6/23	\$0,00													
3980	4.4.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 31/3/20	Thu 23/4/20	\$0,00													
3986	4.4.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 24/4/20	Fri 3/7/20	\$0,00													
4113	4.6	P26	Producto 26: Actividades de sensibilización dirigidas a los ciudadanos para el uso de los trámites digitalizados, realizadas	1365 days	Tue 7/1/20	Mon 31/3/25	\$50.000,00													
4114	4.6.1	GRP - Act. # 2.2	Elaboración del diseño de una estrategia de difusión	125 days	Tue 7/1/20	Mon 29/6/20	\$50.000,00													
4115	4.6.1.1		Actividades de gestión	125 days	Tue 7/1/20	Mon 29/6/20	\$50.000,00													
4116	4.6.2		SBCB_59. Contratación de Firma para la elaboración del diseño e implementación de un Plan de Medios de sensibilización a los ciudadanos en el uso de trámites digitalizados	1310 days	Tue 24/3/20	Mon 31/3/25	\$0,00													
4117	4.6.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 24/3/20	Thu 30/4/20	\$0,00													
4128	4.6.2.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 1/5/20	Mon 2/11/20	\$0,00													
4167	4.6.7		Servicios para organización de eventos	1114 days	Tue 24/3/20	Fri 28/6/24	\$0,00													
4173	5		Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación	1708 days	Tue 12/2/19	Thu 28/8/25	\$1.386.167,00													
4174	5.1	Adm	Administración del Programa	1649 days	Wed 6/3/19	Mon 30/6/25	\$1.070.167,00													
4175	5.1.1		Equipo de la UEP	1649 days	Wed 6/3/19	Mon 30/6/25	\$715.200,00													
4176	5.1.1.1		3CV_101. Contratación del Director del Programa	1649 days	Wed 6/3/19	Mon 30/6/25	\$48.000,00													
4177	5.1.1.1.1		Etapa previa	18 days	Wed 6/3/19	Fri 29/3/19	\$0,00													
4184	5.1.1.1.2		Etapa de Contratación	107 days	Mon 1/4/19	Tue 27/8/19	\$0,00													
4197	5.1.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1587 days	Thu 30/5/19	Mon 30/6/25	\$48.000,00													
4200	5.1.1.2		Equipo Fiduciario	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$289.200,00													
4201	5.1.1.2.1		3CV_102. Contratación de Especialista Financiero	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4202	5.1.1.2.1.1		Etapa previa	18 days	Fri 31/5/19	Tue 25/6/19	\$0,00													
4208	5.1.1.2.1.2		Etapa de Contratación	45 days	Wed 26/6/19	Tue 27/8/19	\$0,00													
4221	5.1.1.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1525 days	Mon 26/8/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4224	5.1.1.2.2		3CV_103. Contratación de Administrador	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4225	5.1.1.2.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4231	5.1.1.2.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
4247	5.1.1.2.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4250	5.1.1.2.3		3CV_104. Contratación de Contador	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$30.000,00													
4251	5.1.1.2.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4257	5.1.1.2.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4273	5.1.1.2.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$30.000,00													
4276	5.1.1.2.4		3CV_105. Contratación de Especialista en Adquisiciones	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4277	5.1.1.2.4.1		Etapa previa	18 days	Fri 31/5/19	Tue 25/6/19	\$0,00													
4283	5.1.1.2.4.2		Etapa de Contratación	45 days	Wed 26/6/19	Tue 27/8/19	\$0,00													
4296	5.1.1.2.4.3		Etapa de ejecución del contrato	1525 days	Mon 26/8/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4299	5.1.1.2.5		3CV_106. Contratación de Oficial de Adquisiciones	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$24.000,00													
4300	5.1.1.2.5.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4306	5.1.1.2.5.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4322	5.1.1.2.5.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$24.000,00													
4325	5.1.1.2.6		3CV_107. Contratación de personal de Apoyo Fiduciario	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$54.000,00													
4326	5.1.1.2.6.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4332	5.1.1.2.6.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4348	5.1.1.2.6.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$54.000,00													
4351	5.1.1.2.7		3CV_108. Contratación de Especialistas Jurídicos	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$18.000,00													
4352	5.1.1.2.7.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4358	5.1.1.2.7.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4374	5.1.1.2.7.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$18.000,00													
4377	5.1.1.2.8		3CV_109. Contratación de Especialista en Comunicaciones	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4378	5.1.1.2.8.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4384	5.1.1.2.8.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4400	5.1.1.2.8.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4403	5.1.1.2.9		3CV_110. Contratación de Personal de Apoyo para el Programa	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$19.200,00													
4404	5.1.1.2.9.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4410	5.1.1.2.9.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4426	5.1.1.2.9.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$19.200,00													
4429	5.1.1.3		Componente I	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$96.000,00													
4430	5.1.1.3.1		3CV_111. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4431	5.1.1.3.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4437	5.1.1.3.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4453	5.1.1.3.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4456	5.1.1.3.2		3CV_112. Contratación de Especialista Técnico 2	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$36.000,00													
4457	5.1.1.3.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4463	5.1.1.3.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4479	5.1.1.3.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1170 days	Fri 3/1/20	Fri 28/6/24	\$36.000,00													
4482	5.1.1.3.3		3CV_113. Contratación de Técnico de Apoyo	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$24.000,00													
4483	5.1.1.3.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1


ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
4489	5.1.1.3.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4505	5.1.1.3.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$24.000,00													
4508	5.1.1.4		Componente II	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$96.000,00													
4509	5.1.1.4.1		3CV_114. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4510	5.1.1.4.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4516	5.1.1.4.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4532	5.1.1.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4535	5.1.1.4.2		3CV_115. Contratación de Especialista Técnico 2	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$36.000,00													
4536	5.1.1.4.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4542	5.1.1.4.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4558	5.1.1.4.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1170 days	Fri 3/1/20	Fri 28/6/24	\$36.000,00													
4561	5.1.1.4.3		3CV_116. Contratación de Técnico de Apoyo	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$24.000,00													
4562	5.1.1.4.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4568	5.1.1.4.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4584	5.1.1.4.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$24.000,00													
4587	5.1.1.5		Componente III	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$72.000,00													
4588	5.1.1.5.1		3CV_117. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4589	5.1.1.5.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4595	5.1.1.5.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4611	5.1.1.5.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4614	5.1.1.5.2		3CV_118. Contratación de Especialista Técnico 2	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4615	5.1.1.5.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4621	5.1.1.5.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4637	5.1.1.5.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4640	5.1.1.6		Componente IV	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$114.000,00													
4641	5.1.1.6.1		3CV_119. Contratación de Coordinador para el Componente IV	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$42.000,00													
4642	5.1.1.6.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4648	5.1.1.6.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4664	5.1.1.6.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$42.000,00													
4667	5.1.1.6.2		3CV_120. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4668	5.1.1.6.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4674	5.1.1.6.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4690	5.1.1.6.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4693	5.1.1.6.3		3CV_121. Contratación de Especialista Técnico 2	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4694	5.1.1.6.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00													
4700	5.1.1.6.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00													
4716	5.1.1.6.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4719	5.1.2		Servicios Especializados de Apoyo a la UEP	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$20.000,00													
4720	5.1.2.1		SCC_81. Contratación de firma consultora para servicios de Asesoría en Estrategia Comunicacional del Programa	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$20.000,00													

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1







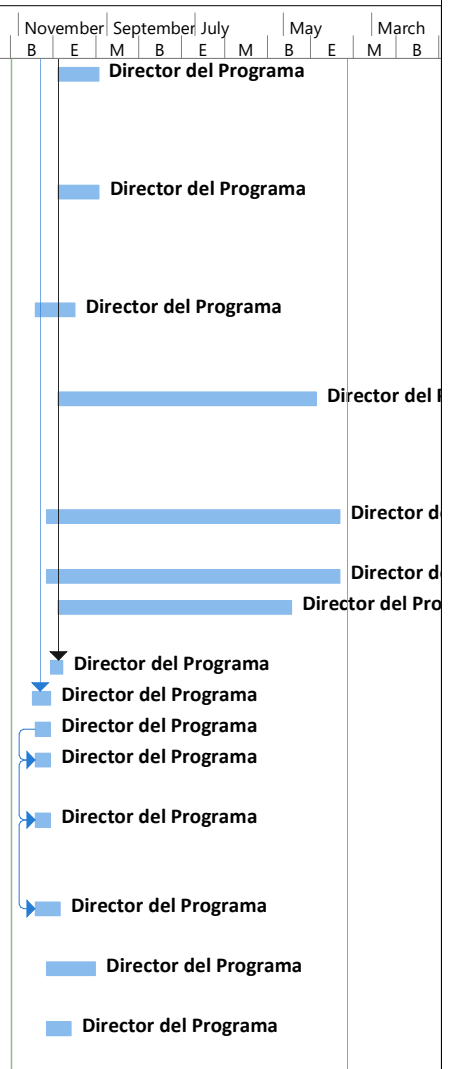











ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
4721	5.1.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00													
4732	5.1.2.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00													
4752	5.1.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1393 days	Wed 26/2/20	Mon 30/6/25	\$20.000,00													
4755	5.1.3		Mobiliario y Equipos Informáticos	150 days	Tue 1/10/19	Mon 27/4/20	\$93.000,00													
4756	5.1.3.1		SBE_14. Adquisición de mobiliario para la UEP	150 days	Tue 1/10/19	Mon 27/4/20	\$39.000,00													
4757	5.1.3.1.1		Etapa previa	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00													
4762	5.1.3.1.2		Etapa de contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00													
4779	5.1.3.1.3		Ejecución del contrato	88 days	Wed 25/12/19	Mon 27/4/20	\$39.000,00													
4782	5.1.3.2		SBE_15. Adquisición de equipamiento informático y electrónico para la UEP	150 days	Tue 1/10/19	Mon 27/4/20	\$54.000,00													
4783	5.1.3.2.1		Etapa previa	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00													
4788	5.1.3.2.2		Etapa de contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00													
4805	5.1.3.2.3		Ejecución del contrato	88 days	Wed 25/12/19	Mon 27/4/20	\$54.000,00													
4808	5.1.4		Oficinas de la UEP	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$46.080,00													
4809	5.1.4.1		Alquileres	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$46.080,00													
4816	5.1.5		Otros Gastos	1499 days	Tue 1/10/19	Fri 27/6/25	\$195.887,00													
4817	5.1.5.1		SBE_16. Adquisición de un Sistema Informático de Gestión para el Programa	128 days	Tue 1/10/19	Thu 26/3/20	\$100.000,00													
4818	5.1.5.1.1		Etapa previa	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00													
4823	5.1.5.1.2		Proceso de Contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00													
4840	5.1.5.1.3		Ejecución del contrato	66 days	Wed 25/12/19	Thu 26/3/20	\$100.000,00													
4843	5.1.5.2		Servicios básicos	1499 days	Tue 1/10/19	Fri 27/6/25	\$12.000,00													
4850	5.1.5.3		CD_32. Contratación de Servicios de conexión a internet para las oficinas de la UEP	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$3.600,00													
4851	5.1.5.3.1		Etapa previa	20 days	Tue 1/10/19	Mon 28/10/19	\$0,00													
4858	5.1.5.3.2		Etapa de contratación	57 days	Tue 29/10/19	Wed 15/1/20	\$0,00													
4875	5.1.5.3.3		Ejecución del contrato	1162 days	Wed 15/1/20	Fri 28/6/24	\$3.600,00													
4878	5.1.5.4		SBE_17. Adquisición de útiles de oficina para la UEP	1435 days	Tue 1/10/19	Mon 31/3/25	\$9.600,00													
4879	5.1.5.4.1		Etapa previa	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00													
4884	5.1.5.4.2		Etapa de contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00													
4901	5.1.5.4.3		Ejecución del contrato	1373 days	Wed 25/12/19	Mon 31/3/25	\$9.600,00													
4904	5.1.5.5		Gratificaciones por servicios especiales	1499 days	Tue 1/10/19	Fri 27/6/25	\$70.687,00													
4911	5.2	Adm	Monitoreo del Programa	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4912	5.2.1		3CV_119. Contratación de Especialista en Planeación y Monitoreo	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
4913	5.2.1.1		Etapa previa	18 days	Fri 31/5/19	Tue 25/6/19	\$0,00													
4919	5.2.1.2		Etapa de Contratación	45 days	Wed 26/6/19	Tue 27/8/19	\$0,00													
4932	5.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1525 days	Mon 26/8/19	Mon 30/6/25	\$36.000,00													
5196	5.5		Gestión de Riesgos del Programa	1665 days	Tue 12/2/19	Mon 30/6/25	\$0,00													
5197	5.5.1	GRP - Act. # 1.1	Implementar un sistema de información financiera y contable que permita el registro de las transacciones y la emisión de información requeridos por el BID	91 days	Tue 27/8/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa												

Plan Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 - Año 1

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	POA Año 1	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
5198	5.5.2	GRP - Act. # 1.2	Se requiere fortalecer el área a cargo de las adquisiciones con la incorporación de personal con experiencia y conocimiento en políticas de organismos multilaterales y a través de cursos y talleres específicos sobre las Políticas de adquisiciones del BID.	221 days	Tue 27/8/19	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa												
5199	5.5.3	GRP - Act. # 1.3	Elaboración y difusión de manuales de funciones y procedimientos, socialización del alcance del proyecto con las unidades SENATICs y los beneficiarios, así como el monitoreo de cumplimiento de las funciones y procedimientos	221 days	Tue 27/8/19	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa												
5200	5.5.4	GRP - Act. # 1.4	La UEP deberá ser fortalecida con los personales idóneos y por medio de capacitaciones en materia de gestión financiera, así como auditoría.	215 days	Wed 6/3/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa												
5201	5.5.5	GRP - Act. # 1.5	Realizar actividades de difusión pública abierta e invitaciones a empresas del área para conocer mejor las necesidades del proyecto. Consultas previas a las especificaciones técnicas de manera virtual	1396 days	Tue 27/8/19	Tue 31/12/24	\$0,00	Director del Programa												
5202	5.5.6	GRP - Act. # 1.6	Elaboración, difusión y cumplimiento de manuales de funciones y procedimientos	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$0,00	Director del Programa												
5203	5.5.7	GRP - Act. # 1.7	Socialización del proyecto con los beneficiarios	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$0,00	Director del Programa												
5204	5.5.8	GRP - Act. # 1.8	Contratación y designación de personal que cumpla con los perfiles profesionales requeridos	1264 days	Tue 27/8/19	Fri 28/6/24	\$0,00	Director del Programa												
5205	5.5.9	GRP - Act. # 1.9	Designación oportuna del personal de la UEP	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Director del Programa												
5206	5.5.10	GRP - Act. # 1.10	Involucrar a las áreas administrativas y técnicas	100 days	Tue 12/2/19	Mon 1/7/19	\$0,00	Director del Programa												
5207	5.5.11	GRP - Act. # 1.11	Contratar al personal fiscalizador necesario	83 days	Wed 6/3/19	Fri 28/6/19	\$0,00	Director del Programa												
5208	5.5.14	GRP - Act. # 1.12	Asegurarse de que en el ROP se incluyan las funciones y procedimientos internos en forma clara	83 days	Wed 6/3/19	Fri 28/6/19	\$0,00	Director del Programa												
5209	5.5.15	GRP - Act. # 1.13	Hacer un seguimiento coordinado con el gobierno para promover el Programa y lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa	83 days	Wed 6/3/19	Fri 28/6/19	\$0,00	Director del Programa												
5210	5.5.16	GRP - Act. # 1.14	Designación oportuna del personal necesario para conformar la UEP	135 days	Wed 6/3/19	Tue 10/9/19	\$0,00	Director del Programa												
5211	5.5.12	GRP - Act. # 3.1	Creación de una SUAF en el marco de la dirección de la UEP y mejorar la gestión financiera	264 days	Fri 31/5/19	Wed 3/6/20	\$0,00	Director del Programa												
5212	5.5.13	GRP - Act. # 3.4	Acto administrativo o reglamento de la función y personal asignado a esas funciones	132 days	Fri 31/5/19	Mon 2/12/19	\$0,00	Director del Programa												



Proyecto: POA Año 1 del Program
Fecha: Mon 10/9/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
